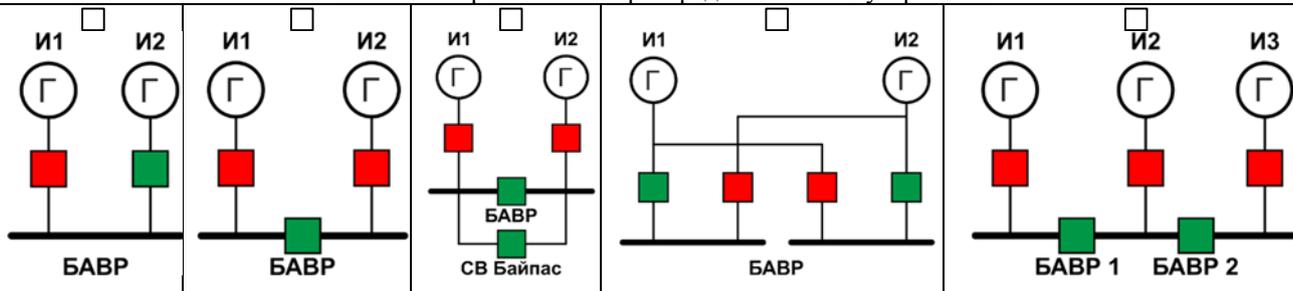


**КАРТА ЗАКАЗА**  
**на поставку комплектного устройства ШЭ-АПС-БАВР**

Отметьте знаком  (редактируется двойным нажатием) то, что Вам требуется, или впишите данный параметр.

Исполнение шкафа			
Напряжение питания оперативного тока	<input type="checkbox"/> =/≈ 220В	<input type="checkbox"/> ≈ 220В /=110В	
Номинальный ток вторичных обмоток ТТ	<input checked="" type="checkbox"/> (5/1)А		
Нижнее значение рабочей температуры	<input type="checkbox"/> - 10 /+ 40 °С	<input type="checkbox"/> - 20 /+ 40 °С	<input type="checkbox"/> - 40 /+ 55 °С
Климатическое исполнение	<input type="checkbox"/> УХЛ1	<input checked="" type="checkbox"/> УХЛ3	
Подвод кабеля	<input type="checkbox"/> Сверху	<input checked="" type="checkbox"/> Снизу	
Наличие трансформаторов напряжения и/или ТСН до ВВ на секцию	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Необходимость функции ВНР	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Схема электроснабжения распределительного устройства			
			
Номинальное напряжение РУ	<input type="checkbox"/> 0,4 кВ	<input type="checkbox"/> 6 кВ	<input type="checkbox"/> 10 кВ
Требуемое время переключения	<input type="checkbox"/> не более 40 мс	<input type="checkbox"/> 40-65 мс	<input type="checkbox"/> 65-85 мс
Наличие свободной релейной обмотки на существующих ТТ БАВР	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ)	<input checked="" type="checkbox"/> 1400x600x400 мм	<input type="checkbox"/> мм	
Параметры схемы электроснабжения			
Вводной выключатель, тип, номинал	<input type="checkbox"/> ЭМ	<input type="checkbox"/> МП	
Секционный выключатель, тип, номинал	<input type="checkbox"/> ЭМ	<input type="checkbox"/> МП	
Тип КРУ / КСО	<input type="checkbox"/> КРУ	<input type="checkbox"/> КСО	
Тип установленной РЗА ВВ, СВ, тип	<input type="checkbox"/> ЭМ <input type="checkbox"/> МП/ВВ	<input type="checkbox"/> ЭМ <input type="checkbox"/> МП/СВ	
Замена на ВВ, тип, номинал	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Замена на СВ, тип, номинал	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Замена РЗА, ВВ, СВ, тип	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Оперативный ток (=/≈, номинал)	<input type="checkbox"/> =220В	<input type="checkbox"/> ≈ 220В	<input type="checkbox"/> =110В
Модернизация схемы 0,4кВ	<input type="checkbox"/> Байпас	<input type="checkbox"/> Нет	
Дополнительные работы			
Шефнадзор СМР	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Шефнадзор ПНР	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Внешняя упаковка шкафа			
<input checked="" type="checkbox"/> Ящик фанерный по ГОСТ 10198-91, тип VII-2			
Интерфейс связи с АСУ ТП			
Протоколы связи	<input checked="" type="checkbox"/> Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, МЭК 61850 (SV)		
Тип канала связи	<input checked="" type="checkbox"/> TX	<input type="checkbox"/> FX	
Примечания			
Контактные данные лица, заполнившего карту заказа			
Наименование предприятия			
Фамилия Имя Отчество			
Должность			
Контактный телефон			
E-mail			
